ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio territoriale di Lanusei

COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

PROGETTO ESECUTIVO

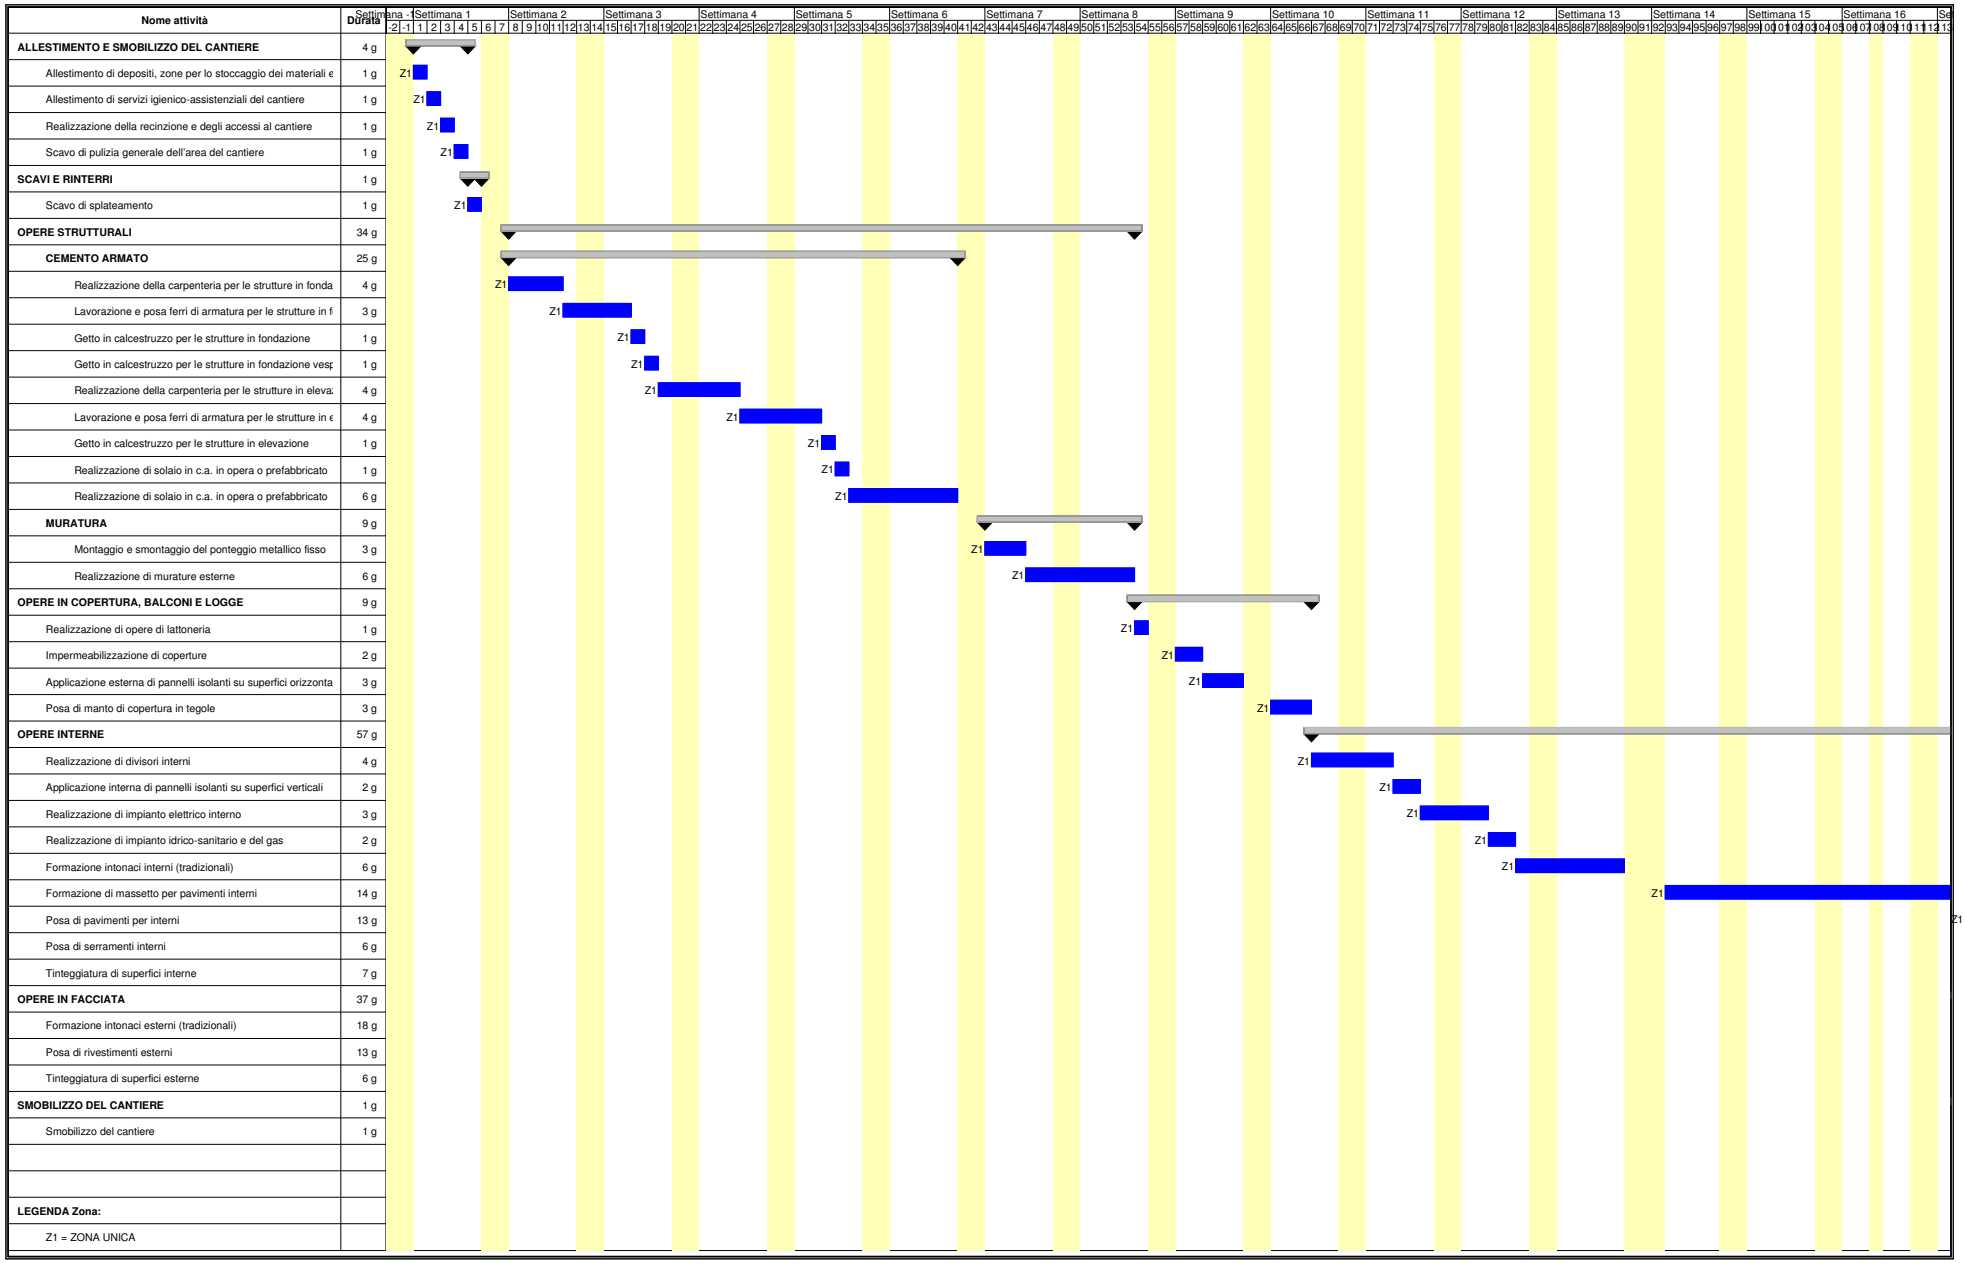
Denominazione:

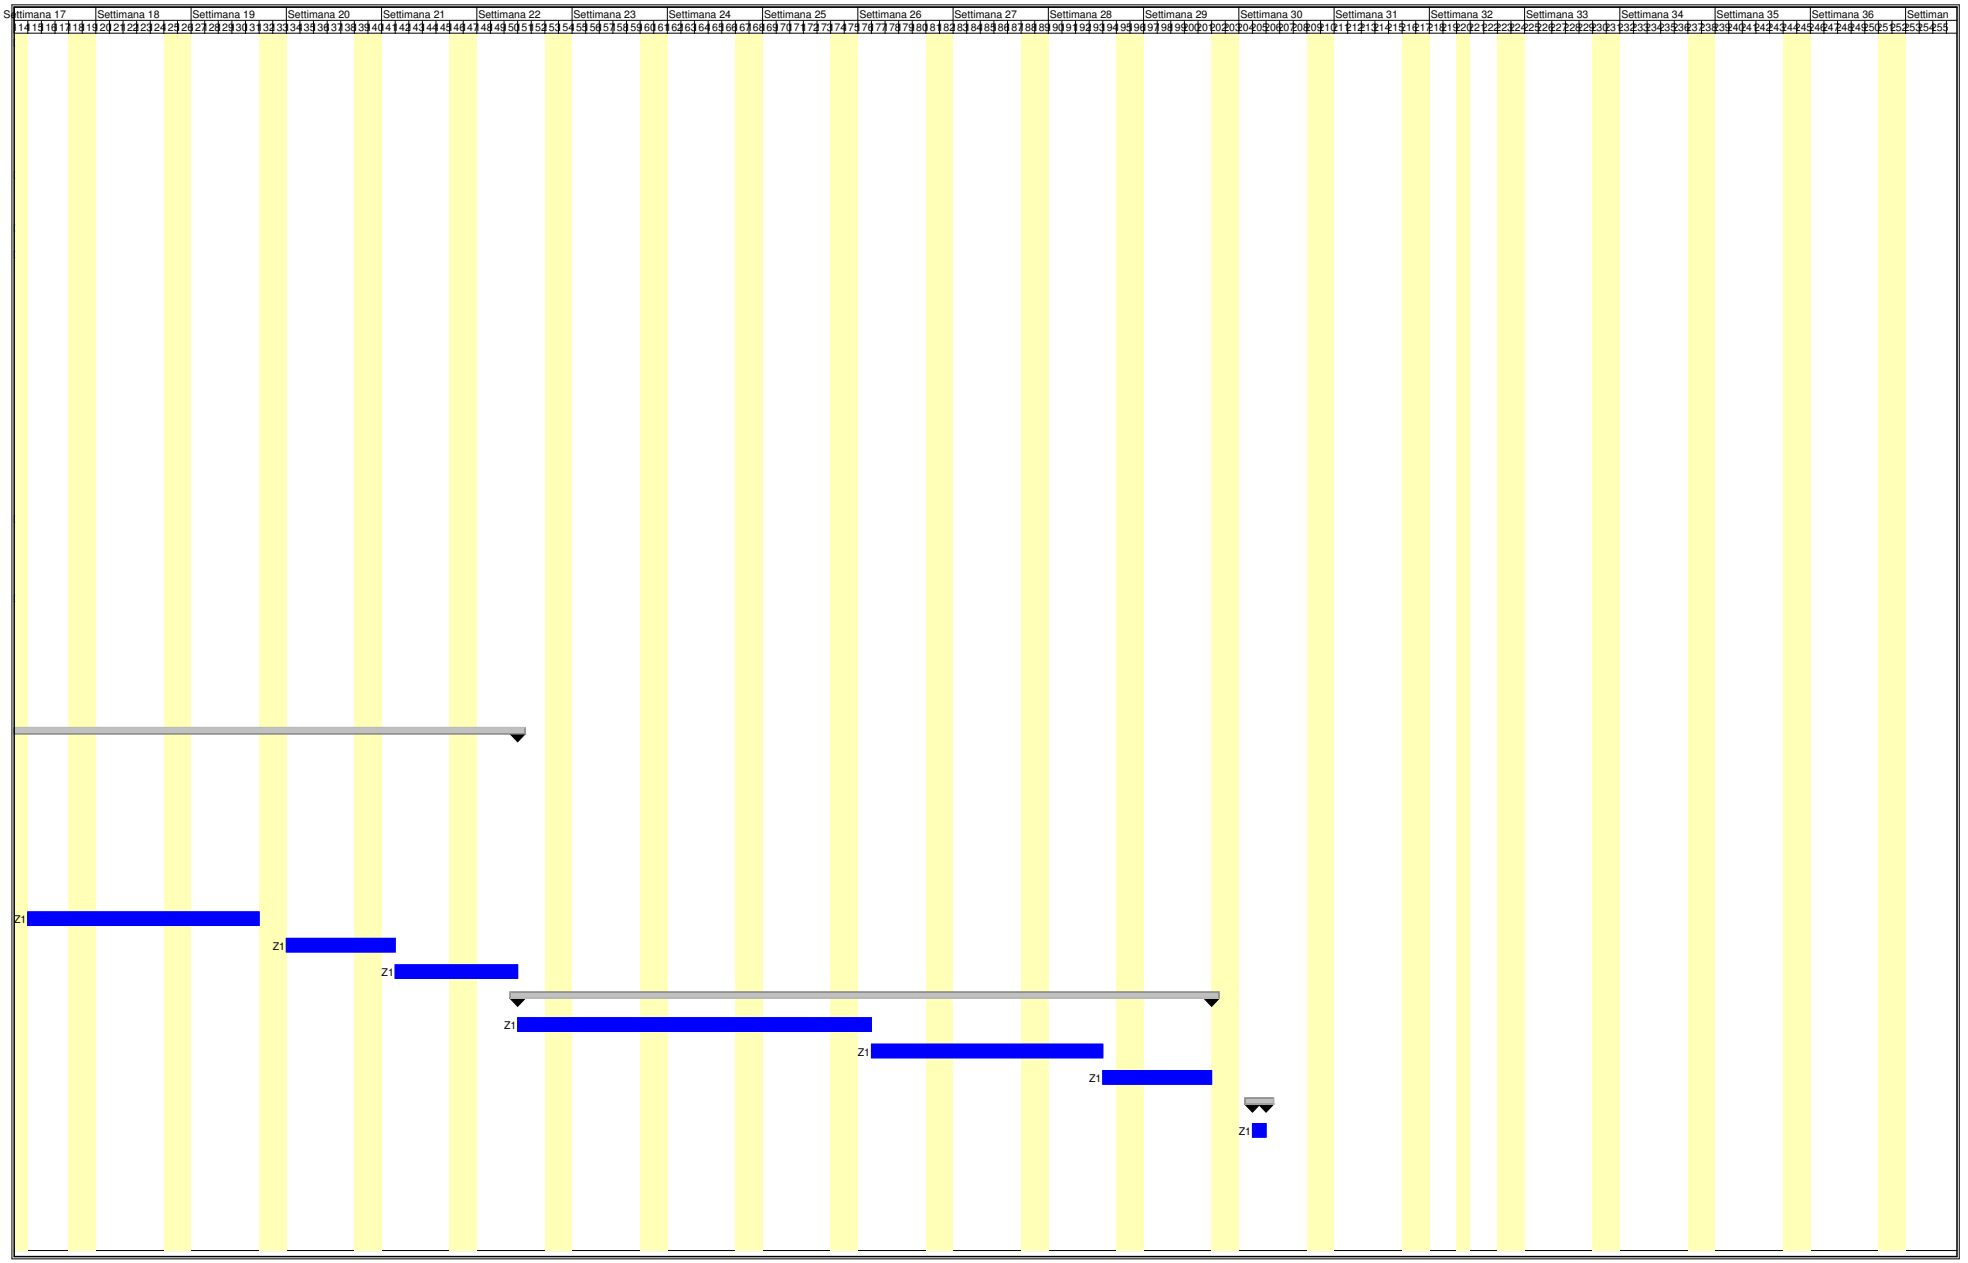
REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO
DESTINATO A DEPOSITO MEZZI E RIEMPIMENTO FITOCELLE
IN LOC. SAN CRISTOFORO

Oggetto tavola:	Allegato
DIAGRAMMA DI GANTT E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	O

Progettista:	Data:	Scala:
Dott. Ing. VINCENZO PINNA	MAGGIO 2012	

Direttore del Servizio Territoriale	Responsabile del Procedimento
Dott. For. SALVATORE MELE	Dott. For. NICOLA SANNA


Nome attività
Durata
Settimana -1
Settimana 1
Settimana 2
Settimana 3
Settimana 4
Settimana 5
Settimana 6
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g
SCAVI E RINTERRI 1 g
Scavo di splateamento 1 g
OPERE STRUTTURALI 34 g
CEMENTO ARMATO 25 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda 4 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f 3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione vesp 1 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in eleva 4 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in e 4 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 g
MURATURA 9 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g
Realizzazione di murature esterne 6 g
OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 9 g
Realizzazione di opere di lattoneria 1 g
Impermeabilizzazione di coperture 2 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzonta 3 g
Posa di manto di copertura in tegole 3 g
OPERE INTERNE 57 g
Realizzazione di divisori interni 4 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 2 g
Realizzazione di impianto elettrico interno 3 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 2 g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g
Formazione di massetto per pavimenti interni 14 g
Posa di pavimenti per interni 13 g
Posa di serramenti interni 6 g
Tinteggiatura di superfici interne 7 g
OPERE IN FACCIATA 37 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 18 g
Posa di rivestimenti esterni 13 g
Tinteggiatura di superfici esterne 6 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g
Smobilizzo del cantiere 1 g
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
Z1


Settimana 17
Settimana 18
Settimana 19
Settimana 20
Settimana 21
Settimana 22
Settimana 23
Settimana 24
Settimana 25
Settimana 26
Settimana 27
Settimana 28
Settimana 29
Settimana 30
Settimana 31
Settimana 32
Settimana 33
Settimana 34
Settimana 35
Settimana 36
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
