

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	Demolizioni	25 g	gio 02/04/09	mer 06/05/09	
2	Consolidamento strutturale	30 g	gio 07/05/09	mer 17/06/09	1
3	Opere edili	96 g	gio 18/06/09	gio 29/10/09	2
4	Impianto idrico-fognario	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2
5	Impianto elettrico	24 g	gio 18/06/09	mar 21/07/09	2
6	Impianto termico	30 g	gio 18/06/09	mer 29/07/09	2
7	Impianto prevenzione incendi	5 g	gio 18/06/09	mer 24/06/09	2
8	Impianto rivelazione incendi	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
9	Impianto TV	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
10	Infissi	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2

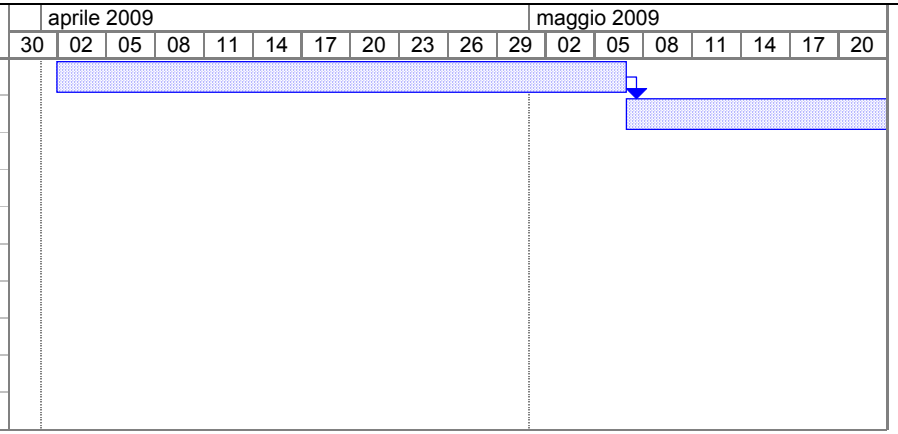

Progetto: Cronoprogramma EF
Data: mar 09/12/08

Attività
Divisione
Avanzamento
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	Demolizioni	25 g	gio 02/04/09	mer 06/05/09	
2	Consolidamento strutturale	30 g	gio 07/05/09	mer 17/06/09	1
3	Opere edili	96 g	gio 18/06/09	gio 29/10/09	2
4	Impianto idrico-fognario	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2
5	Impianto elettrico	24 g	gio 18/06/09	mar 21/07/09	2
6	Impianto termico	30 g	gio 18/06/09	mer 29/07/09	2
7	Impianto prevenzione incendi	5 g	gio 18/06/09	mer 24/06/09	2
8	Impianto rivelazione incendi	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
9	Impianto TV	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
10	Infissi	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2

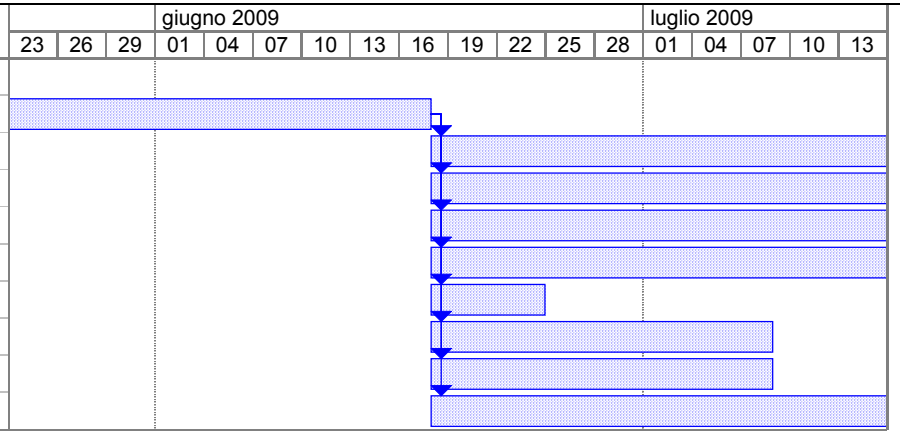

Progetto: Cronoprogramma EF
Data: mar 09/12/08

Attività
Divisione
Avanzamento
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	Demolizioni	25 g	gio 02/04/09	mer 06/05/09	
2	Consolidamento strutturale	30 g	gio 07/05/09	mer 17/06/09	1
3	Opere edili	96 g	gio 18/06/09	gio 29/10/09	2
4	Impianto idrico-fognario	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2
5	Impianto elettrico	24 g	gio 18/06/09	mar 21/07/09	2
6	Impianto termico	30 g	gio 18/06/09	mer 29/07/09	2
7	Impianto prevenzione incendi	5 g	gio 18/06/09	mer 24/06/09	2
8	Impianto rivelazione incendi	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
9	Impianto TV	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
10	Infissi	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2

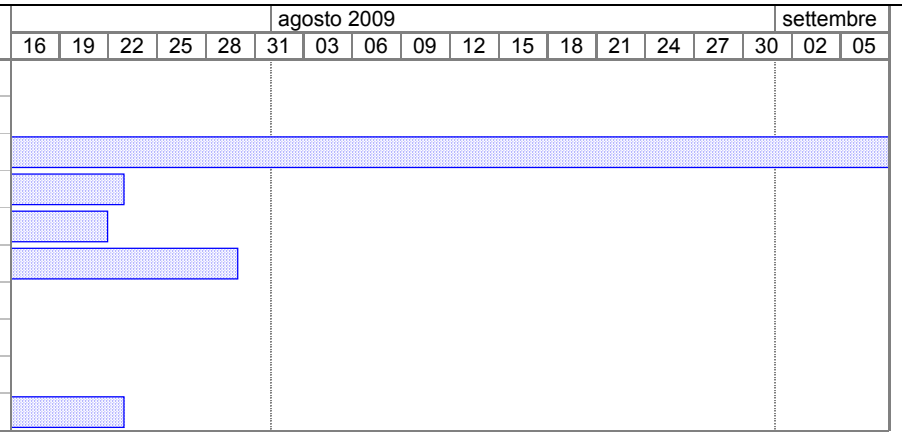

Progetto: Cronoprogramma EF
Data: mar 09/12/08

Attività
Divisione
Avanzamento
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	Demolizioni	25 g	gio 02/04/09	mer 06/05/09	
2	Consolidamento strutturale	30 g	gio 07/05/09	mer 17/06/09	1
3	Opere edili	96 g	gio 18/06/09	gio 29/10/09	2
4	Impianto idrico-fognario	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2
5	Impianto elettrico	24 g	gio 18/06/09	mar 21/07/09	2
6	Impianto termico	30 g	gio 18/06/09	mer 29/07/09	2
7	Impianto prevenzione incendi	5 g	gio 18/06/09	mer 24/06/09	2
8	Impianto rivelazione incendi	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
9	Impianto TV	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
10	Infissi	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2

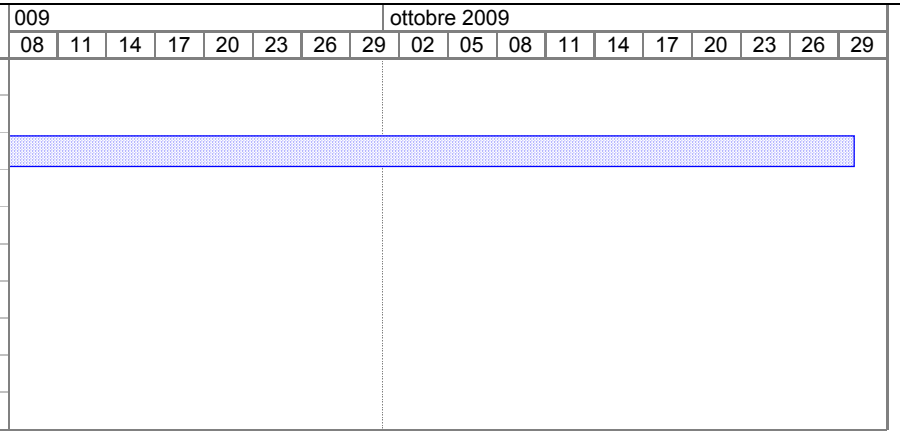

Progetto: Cronoprogramma EF
Data: mar 09/12/08

Attività
Divisione
Avanzamento
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	Demolizioni	25 g	gio 02/04/09	mer 06/05/09	
2	Consolidamento strutturale	30 g	gio 07/05/09	mer 17/06/09	1
3	Opere edili	96 g	gio 18/06/09	gio 29/10/09	2
4	Impianto idrico-fognario	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2
5	Impianto elettrico	24 g	gio 18/06/09	mar 21/07/09	2
6	Impianto termico	30 g	gio 18/06/09	mer 29/07/09	2
7	Impianto prevenzione incendi	5 g	gio 18/06/09	mer 24/06/09	2
8	Impianto rivelazione incendi	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
9	Impianto TV	15 g	gio 18/06/09	mer 08/07/09	2
10	Infissi	25 g	gio 18/06/09	mer 22/07/09	2

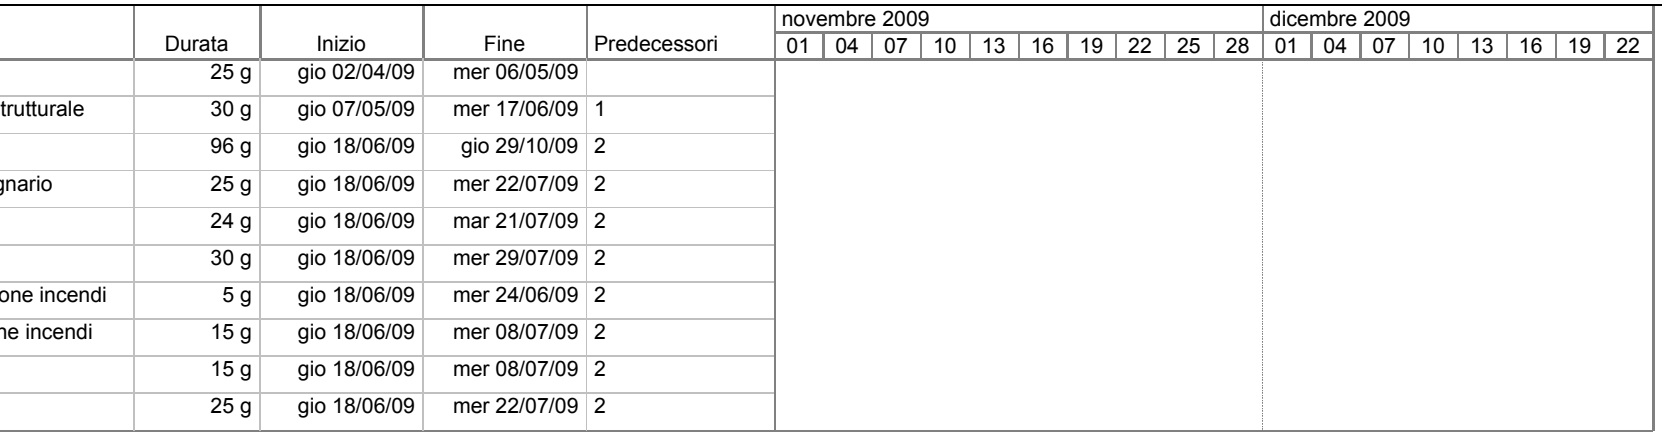

Progetto: Cronoprogramma EF
Data: mar 09/12/08

Attività
Divisione
Avanzamento
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza
